


世田谷区本庁舎等整備工事 地域貢献提案額達成状況（令和6年3月末時点）

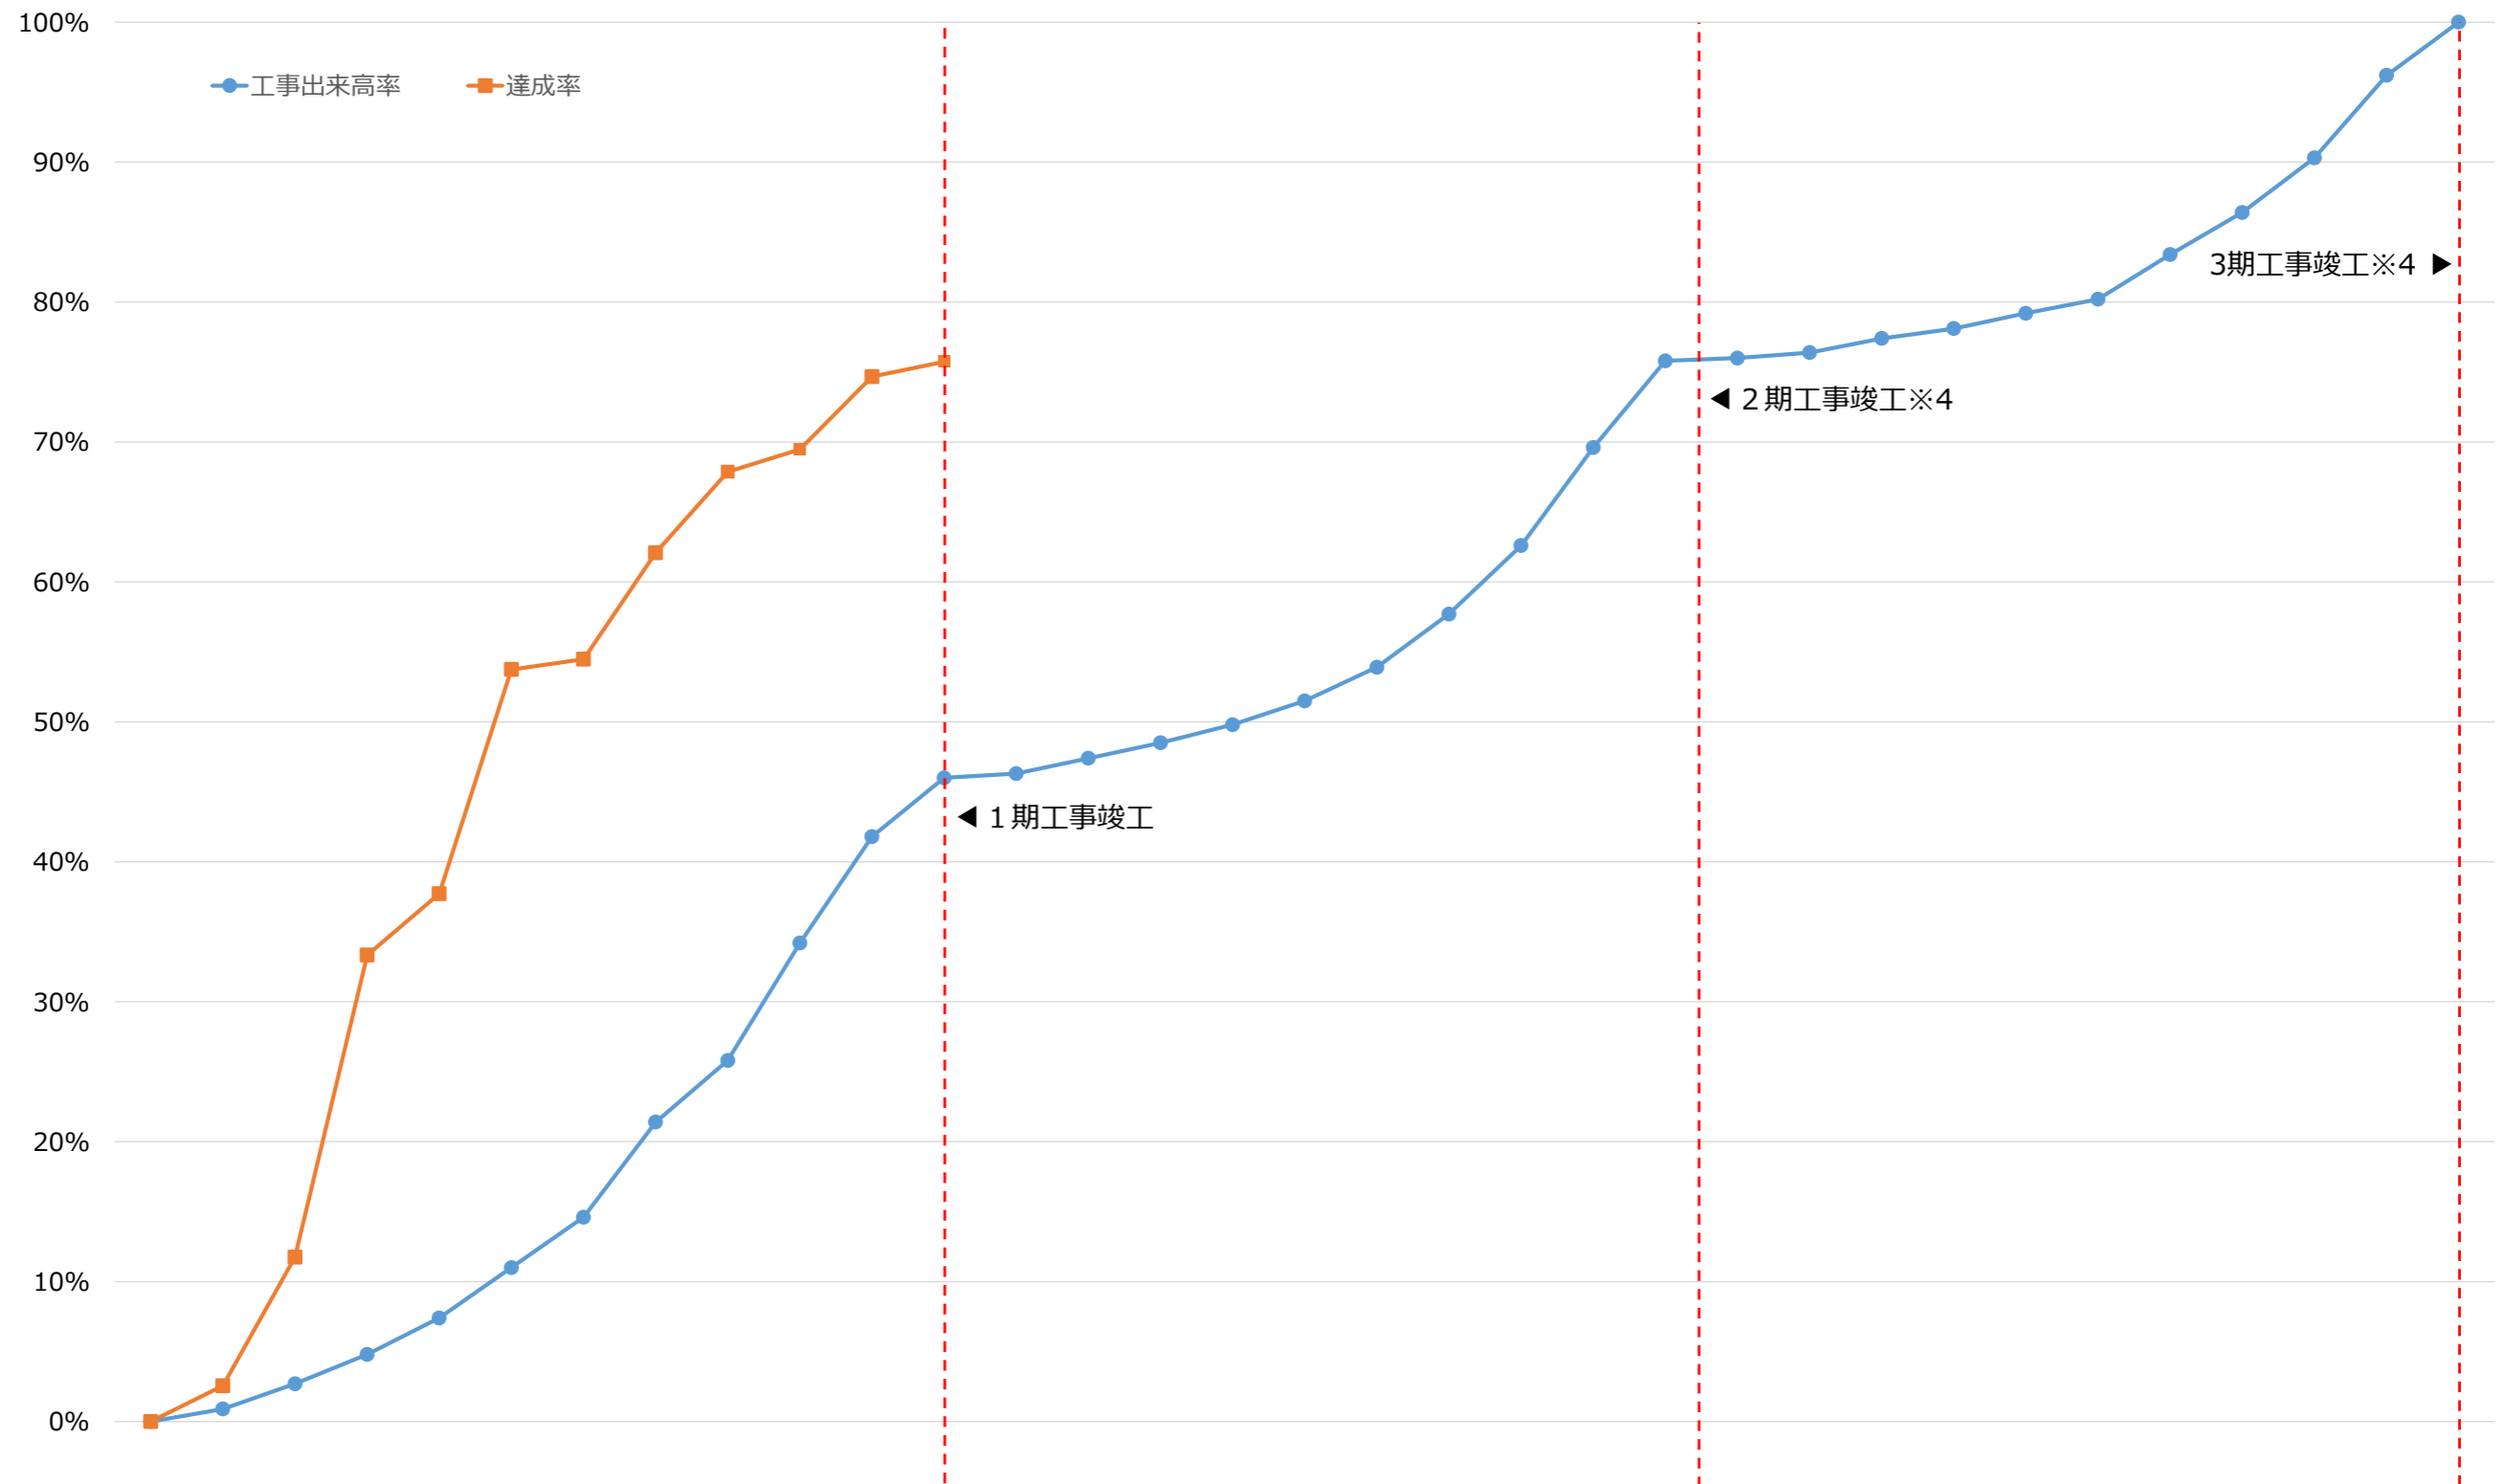

年	2021年				2022年				2023年				2024年				2025年				2026年				2027年				2028年				2029年
年度	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度
月	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末
工事出来高※1	0.0%	0.9%	2.7%	4.8%	7.4%	11.0%	14.6%	21.4%	25.8%	34.2%	41.8%	46.0%	46.3%	47.4%	48.5%	49.8%	51.5%	53.9%	57.7%	62.6%	69.6%	75.8%	76.0%	76.4%	77.4%	78.1%	79.2%	80.2%	83.4%	86.4%	90.3%	96.2%	100.0%
地域貢献額※2	0	204	939	2,665	3,016	4,297	4,355	4,964	5,426	5,554	5,970	6,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
提案金額に対する達成率※3	0.0%	2.6%	11.8%	33.3%	37.7%	53.7%	54.5%	62.1%	67.9%	69.5%	74.7%	75.7%																					

※1 工事出来高は工程表に基づく、予定の数値 ※2 地域貢献額は工事着手時からの契約金額に基づく累計金額（単位：百万円） ※3 提案金額は7,995,680,000円  
 ※4 2期完成日（令和8年10月23日）、3期完成日（令和11年6月8日）は、令和5年9月7日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で報告した「世田谷区本庁舎等整備工事における工程遅延に係る経緯等報告書（2・3期工事）等の検証結果について」に記載の完成日
