

令和元年度台風第19号に伴う
 二子玉川緑地運動場復旧作業の検討状況について

1. 主旨

昨年10月、台風第19号により被害を受けた二子玉川緑地運動場の復旧について、令和元年11月13日、12月3日、令和2年2月5日のオリンピック・パラリンピック等特別委員会に報告を行ってきたところである。

今回、新型コロナウイルスの感染拡大の影響などを踏まえ、復旧作業の検討状況をまとめたので報告する。

2. これまでの経過

令和元年10月12日	台風第19号により全面冠水（全面利用休止）
～11月下旬	一部園路応急復旧・洗浄作業（フェーズ1：予備費） 災害復旧国庫補助申請
12月5日	補正予算議決
12月下旬	国庫補助査定・申請受理
令和2年1月下旬	災害復旧工事発注（指名競争入札）
1月31日	契約締結（専決処分）
2～6月	災害復旧工事（フェーズ2）
2月9日	ボランティアを活用した復旧作業
3月2日	専決処分の承認
3月上旬	指定管理者による水道栓復旧作業

3. 実施状況（別紙1、2参照）

		～R1.12	～R2.06	R2.11以降
運動場園路		フェーズ1		
駐車場（第1・第2・第3）		利用休止	フェーズ2	フェーズ3
野球場	A面		利用休止 (維持管理復旧)	
	B・C・D面			
	E・F面			
少年野球場	A面		フェーズ2	フェーズ3
	B面		維持管理復旧	
	C面		利用休止	
サッカー場	B面	砂利拾い・ 維持管理復旧	フェーズ3	
	C面			
少年サッカー場	A・B・C面	フェーズ2		
球技場		維持管理復旧	暫定利用	
ゲートボール場		利用休止	利用休止	フェーズ3
ピクニック広場			砂利拾い	

国土交通省による陥没箇所の復旧が完了するまで、安全確認のうえ暫定利用。

裏面あり

4. 今後の復旧作業について

(1) 指定管理者による復旧作業

対象施設 野球場 E・F 面

経 費 指定管理者による二子玉川緑地運動場を含む総合運動場及び大蔵第二運動場指定管理業務の維持管理経費の範囲で対応

内 容 京浜河川事務所との協議により、堆積土砂の処理について、隣接する京浜河川事務所管理範囲の陥没箇所への搬入処分を行い、その後整地作業及び芝の補植作業を実施する。

(2) 土嚢づくり作業

ボランティアによる野球場 B・C・D 面に堆積の土砂を利用した土嚢づくりを検討していたが、新型コロナウイルス感染防止の観点から実施しないこととする。

(3) その他

フェーズ 3 (第二期工事) に向けた検討状況については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響なども踏まえ、今後、課題やスケジュールなどを整理・検討し、区議会に報告する。

なお、現在実施しているフェーズ 2 の工事等についても、今後見直しの可能性がある。

5. 今後の予定

令和 2 年	5 月	フェーズ 3 (第二期工事) の検討状況の報告
	9 月以降	フェーズ 3 (第二期工事) の実施内容等の報告 区議会定例会に補正予算の提案
	11 月以降	フェーズ 3 (第二期工事) の実施

二子玉川緑地運動場施設配置図

二子玉川緑地運動場
(宇奈根公園 + 多摩川二子橋公園)


宇奈根公園
(球技場1面、野球場2面)

多摩川二子橋公園
(野球場4面、少年野球場3面、
サッカー場2面、少年サッカー場3面
ピクニック広場、駐車場)
全面的に利用中止中。

フェーズ2 (令和2年6月完了予定)

フェーズ3 (第二期復旧工事)
・野球場B・C・D面
・少年野球場C面
・ゲートボール場
・ピクニック広場

指定管理者による復旧作業
・サッカー場B・C面
・少年野球場B面
・野球場E・F面
・球技場(暫定復旧)
・その他(水道栓等)
・その他(看板類・占用杭等)

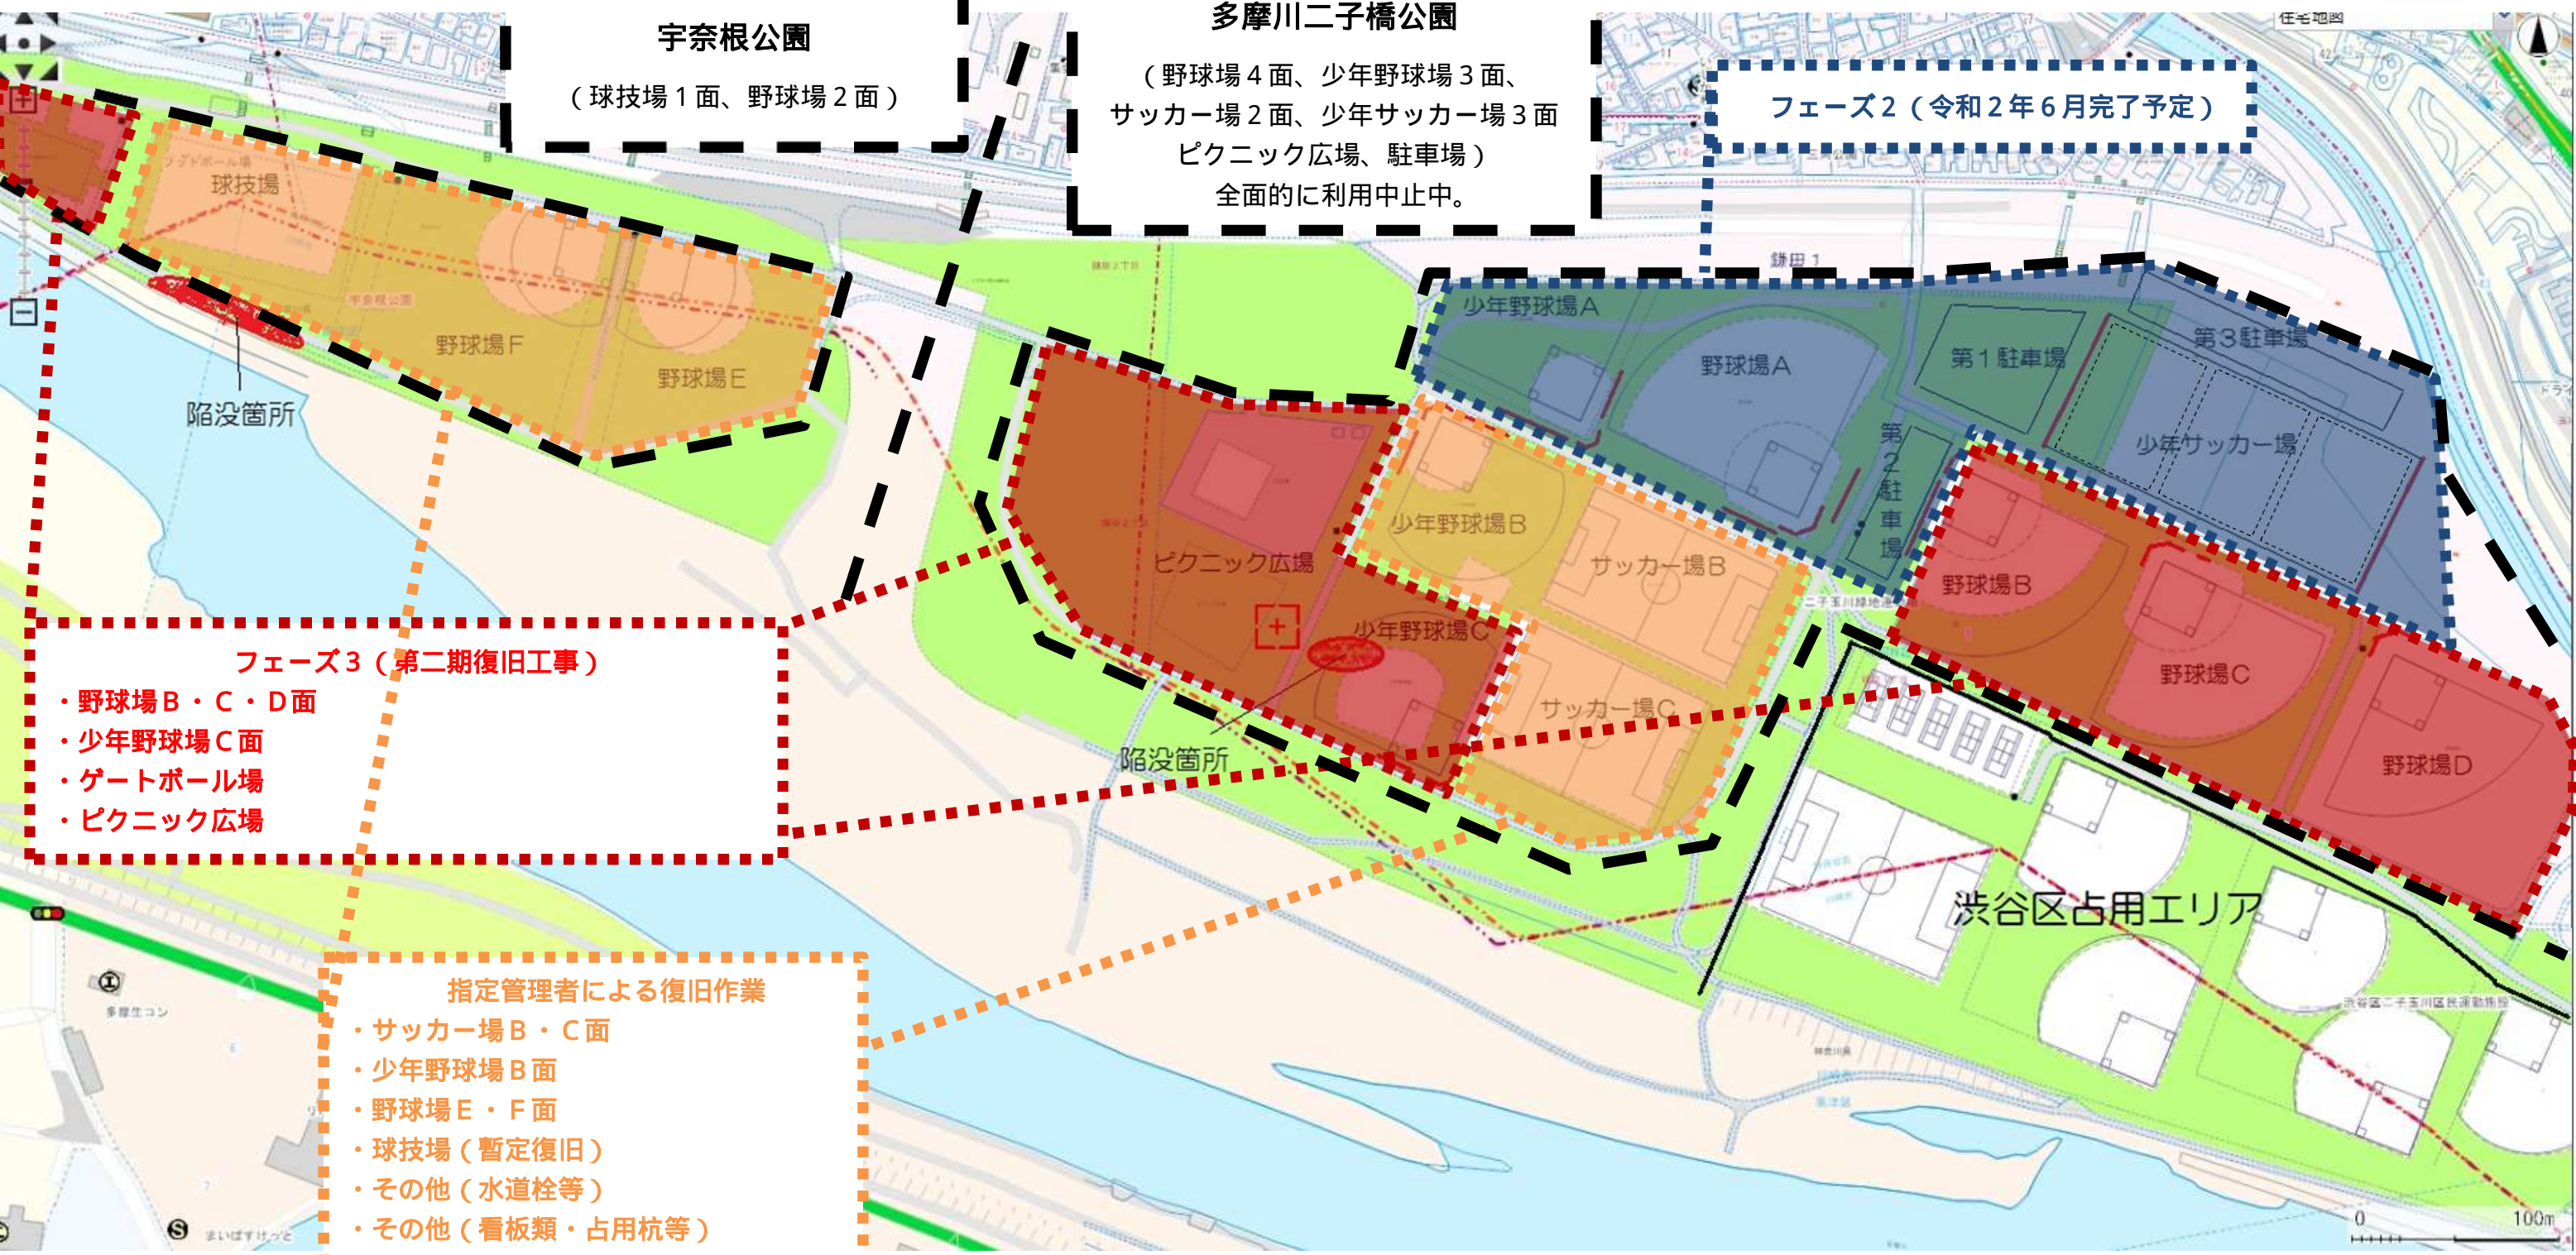

二子玉川緑地運動場今後のスケジュール

【別紙2】

	2019年度					2020年度											2021年度																		
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
		11/10 世田谷246ハーフマラソン 12/15 子ども駅伝 特別委 4定			12/15 子ども駅伝 特別委 1定			特別委	特別委					世田谷246ハーフマラソン 花火大会		子ども駅伝										世田谷246ハーフマラソン 花火大会		子ども駅伝							
工事可能期間	←					←					←					←					←														
二子玉川緑地運動場 施設利用再開(予定)	利用休止					使用可能施設より一部利用再開											全面利用再開																		



運動場園路		園路復旧																											
駐車場	第1	土砂撤去	施設整備	利用再開																									
	第2		施設整備	利用再開																									
	第3		施設整備	利用再開																									
野球場	A	フェーズ2の実施に向けた準備 (補正予算、事業者選定など)	施設整備	芝生養生	利用再開																					整備内容・手法・スケジュールの検討に基づく復旧作業・工事			
	B																												
	C		フェーズ3の実施に向けた準備 (補正予算、事業者選定など)																										
	D																												
	E		維持管理	芝生養生	利用再開																								
少年野球場	A	フェーズ2の実施に向けた準備 (補正予算、事業者選定など)	土砂撤去	施設整備	芝生養生	利用再開																				整備内容・手法・スケジュールの検討に基づく復旧作業・工事			
	B		維持管理整備	利用再開																									
	C		フェーズ3の実施に向けた準備																										
サッカー場	B	砂利拾い	維持管理整備	利用再開																									
	C	維持管理整備	芝生養生	利用再開																									
少年サッカー場	A	フェーズ2の実施に向けた準備 (補正予算、事業者選定など)	土砂撤去	施設整備	利用再開																			芝生養生	整備内容・手法・スケジュールの検討に基づく復旧作業・工事				
	B		土砂撤去	施設整備	芝生養生	利用再開																							
	C																												
球技場			維持管理整備	→																									
ゲートボール場			フェーズ3の実施に向けた準備 (補正予算、事業者選定など)																							整備内容・手法・スケジュールの検討に基づく復旧作業・工事			
ピクニック広場		砂利拾い	フェーズ3の実施に向けた準備 (補正予算、事業者選定など)																							整備内容・手法・スケジュールの検討に基づく復旧作業・工事			
